

【事業に関する問い合わせ先】

千葉県 柏土木事務所 高架事業推進課

野田市役所 建設局 都市部 都市整備課 鉄道高架係

東武鉄道株式会社 改良工事部

TEL：(04)7167-1218

TEL：(04)7125-1111 (内線2506・2511)

TEL：(03)5962-2484

踏切上空にて桁架設工事を実施


平素より東武野田線(野田市)連続立体交差事業にご理解、ご協力いただき誠にありがとうございます。全工区において、踏切と交差する道路上の桁架設工事をしております。高架切替えによるバリアフリー化の実現を目指し、鋭意努力し進めてまいります。

現在、全工区で高架橋工事を進めるとともに、起終点部の盛土工事を実施しております。今後、駅舎の建築工事に着手いたします。愛宕駅・野田市駅間において、昨年11月に第165号踏切、12月に第159号踏切の桁架設工事を実施いたしました。ご協力いただき、ありがとうございました。

第159号踏切(県道つくば野田線・愛宕駅付近)



桁架設工事箇所

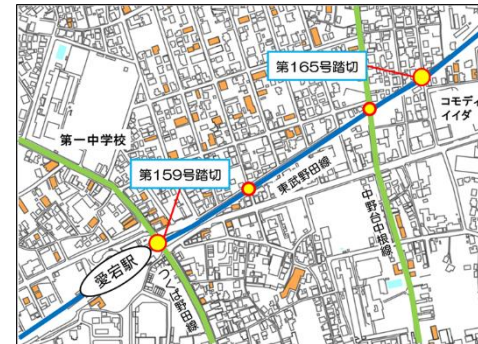

愛宕駅旧改札付近の様子



旧駅舎(平成30年10月2日撮影)

第165号踏切の桁架設工事前後



令和元年7月9日



左：
現在の工事の様子
手前は高架橋の柱部分を
施工中
奥側は駅部を施工中



令和2年1月20日

夜間工事の様子

第159号踏切の桁架設工事は令和元年12月5日に実施いたしました。



封鎖中の第159号踏切



仮設桁を解体する作業員



仮設桁を吊り上げる様子
(手前は200t油圧クレーン)

愛宕駅の施工状況

現在、愛宕駅は駅部の高架橋工事をっており、今後は駅舎やホームの建築工事を進めていきます。駅舎の完成予定は令和2年度末(エレベーター及びエスカレーター設置)、西口駅前広場は3年度末の完成を目指しております。



愛宕駅舎及び西口駅前広場の完成イメージ



現在の駅部施工状況

野田市駅方向

愛宕駅方向

【事業に関する問い合わせ先】

千葉県 柏土木事務所 高架事業推進課
野田市役所 建設局 都市部 都市整備課 鉄道高架係
東武鉄道株式会社 改良工事部

TEL：(04)7167-1218

TEL：(04)7125-1111 (内線2506・2511)

TEL：(03)5962-2484

野田市駅・梅郷駅間において、昨年8月に第170号踏切、12月に第168号踏切の桁架設工事を実施いたしました。ご協力いただき、ありがとうございました。

第168号踏切(県道野田牛久線・野田市駅南側)



第168号踏切の高架橋は、一期施工分(2主桁)の架設が完了しました。また、二期施工分(2主桁)は、令和4年度に架設予定です。




第168号踏切高架橋真下の風景



第168号踏切側高架橋上より撮影

左：桁架設前の踏切
下：桁架設後の現在




至梅郷駅

梅郷駅方面へと続く高架橋

夜間工事の様子

第168号踏切の桁架設工事は令和元年12月19日に実施いたしました。

左：吊り上げられる架設桁。作業員が桁に結んだロープで位置の微調整をしている
真下：作業前にチェックする作業員
右下：濃霧の中、設置される架設桁(作業クレーンは650t油圧式トラッククレーン)



第170号踏切の桁架設工事前後



令和元年7月29日



令和元年11月15日

桁架設工事箇所



第170号踏切高架橋・梅郷駅方面

野田市駅の施工状況

現在、野田市駅は駅部の高架橋工事を行っており、駅舎は令和2年度末の一期施工により、営業線(上下線)の高架切替え(エレベーター及びエスカレーター設置)を目指し進めております。また、駅前広場は令和3年度末の完成を目指しております。



野田市駅舎及び駅前広場の完成イメージ



駅部高架橋の様子



野田市駅部施工状況
